

CARTAGENA VA PA'LANTE




Salvemos Juntos
a Cartagena

An aerial photograph of a city, featuring a large, ornate cathedral with a prominent dome and spire in the center. The surrounding area includes modern buildings, streets, and greenery. The image is overlaid with a semi-transparent grey band containing text.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA
2022**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Pesos Corrientes)**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	% EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	\$ 631.441.615	\$ 631.441.615	\$624.312.752	\$598.810.701	95%
INVERSION	\$17.227.928.391	\$43.344.450.724	\$40.445.407.598	\$32.660.950.348	75,35%
TOTAL GASTOS	\$ 17.859.370.006	\$ 43.975.892.339	\$ 41.069.720.350	\$33.259.761.049	75,64%


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Pesos Corrientes)

RUBROS FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	PRESUPUESTO EJECUTADO (COMPROMISOS)	SALDO DE APROPIACION
Compra de Equipos	\$ 5.128.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.128.863,00
Materiales y suministros	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
Remuneración de servicios Técnicos Honorarios	\$ 624.312.752,00	\$624.312.752	\$ 598.810.701,00	\$ 25.502.051,00
TOTALES	\$ 631.441.615,00	\$624.312.752	\$ 598.810.701,00	\$ 32.630.914,00

INVERSIÓN (Pesos Corrientes)

CONCEPTO	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACION	Coefficiente de Ejecución
INVERSION	\$ 43.344.450.724,00	\$ 40.445.407.598,00	\$ 32.660.950.348,00	\$ 13.844.093.811,00	\$ 18.816.856.537,00	\$ 10.683.500.376,00	75%

GASTOS DE INVERSIÓN
A 30 de Septiembre del 2022
(Miles de Millones de Pesos Corrientes)

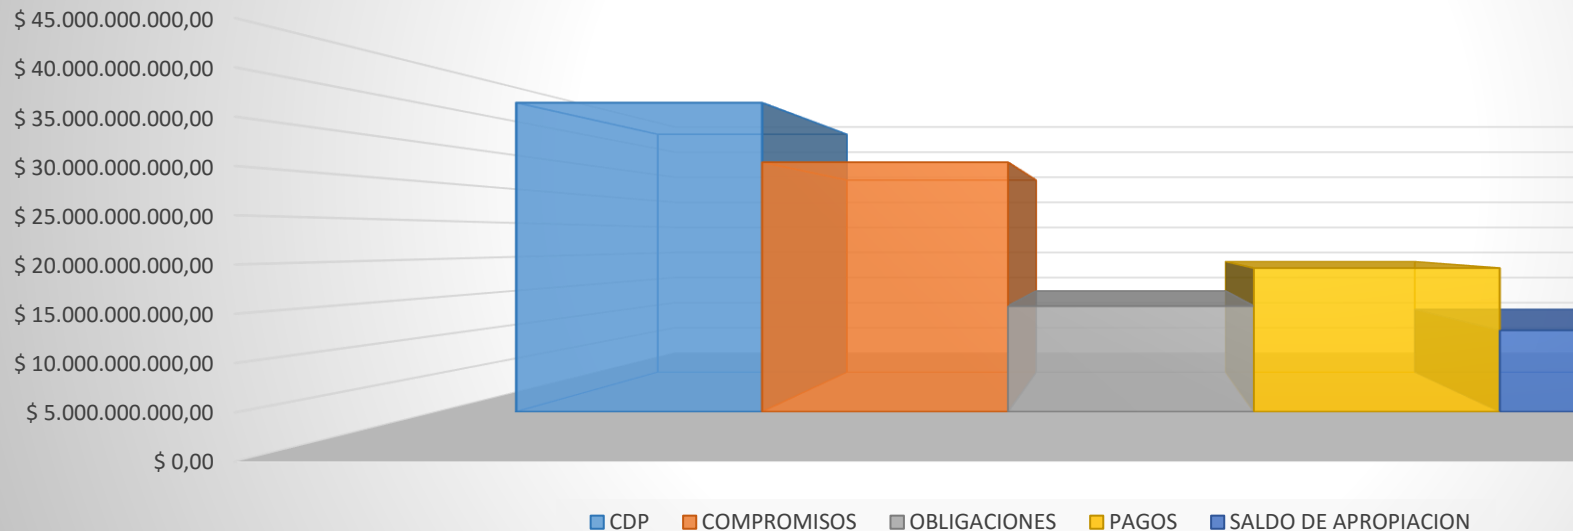

INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Pesos Corrientes)

FUENTE INVERSION 2022	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
TOTAL					
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$11.854.647.149	\$ 14.153.346.724	\$ 12.801.621.117	90,4%	\$ 1.351.725.607
DIVIDENDOS DE ACUACAR	\$671.180.179	\$671.180.179	\$ 671.180.179	100%	\$ 0
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	\$2.035.019.425	\$2.035.019.425	\$ 941.226.047	46,2%	\$ 1.093.793.378
DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ 2.667.081.637	\$2.667.081.637	\$ 1.289.738.997	48%	\$ 1.377.342.640
PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP - PLUSVALIA	\$1	\$1	\$ 0	0%	\$ 1
RB DIVIDENDOS ACUACAR 93	\$0	\$ 774.299.317,00	\$ 0	0%	\$ 774.299.317
RB DIVIDENDOS ACUACAR 95	\$0	\$ 5.786.015.631,00	\$ 466.022.904	8%	\$ 5.319.992.727
R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO 91	\$0	\$ 14.999.983.683,00	\$ 14.999.983.683	100%	\$ 0
R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO 93	\$0	\$ 342.288.365,00	\$ 342.288.365	100%	\$ 0
R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO 95	\$0	\$ 63.135.418,00	\$ 63.135.418	100%	\$ 0
RB IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	\$0	\$ 21.411.060,00	\$ 0	0%	\$ 21.411.060
R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA ALCANTARILLADO 93	\$0	\$ 797.435,00	\$ 0	0%	\$ 797.435
R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA ALCANTARILLADO 95	\$0	\$ 106.911,00	\$ 0	0%	\$ 106.911
RB OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA	\$0	\$ 1.729.784.938,00	\$ 1.085.753.639	63%	\$ 644.031.299
R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$0	\$ 100.000.000,00	\$ 0	0%	\$ 100.000.000
TOTALES	\$ 17.227.928.391	\$ 43.344.450.724	\$32.660.950.349	75%	\$ 10.683.500.375

Fuente: Secretaría de Infraestructura – Predis

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS 2022 (Pesos Corrientes)

PROGAMA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO CUATRENIO
CARTAGENA SE MUEVE	\$ 20.634.306.907,00	\$ 17.741.143.409,00	\$ 13.428.460.755,00	65%	100%
SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD	\$ 4.416.227.511,00	\$ 4.416.227.511,00	\$ 3.380.855.847,00	77%	61%
PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS. LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA	\$ 17.984.416.304,00	\$ 17.984.416.304,00	\$ 15.572.870.915,00	87%	55%
ORDENACIÓN TERRITORIAL. RECUPERACIÓN SOCIAL. AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	\$ 159.500.000,00	\$ 159.500.000,00	\$ 152.505.000,00	96%	39%
PROMOCION. PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA. AFROCOLOMBIANA. RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 150.000.000,00	\$ 143.920.374,00	\$ 126.257.831,00	84%	38%
TOTAL	\$ 43.344.450.722,00	\$ 40.445.207.598,00	\$ 32.660.950.348,00	75%	59%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: CARTAGENA SE MUEVE

PROYECTO: CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 9.110.102.145	\$11.408.801.720	\$10.944.607842	\$464.193878
FUENTE: DIVIDENDOS DE ACUACAR	\$ 671.180.179	\$ 671.180.179	\$671.180.179	\$0
FUENTE: IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO	\$ 2.035.019.425	\$ 2.035.019.425	\$941.226.047	\$1.093.793.378
FUENTE: PARTICIPACIONES DISTINTAS A SGP – PLUSVALIA	\$1	\$1	\$0	\$1
FUENTE: RB DIVIDENDOS ACUACAR 93	\$0	\$774.299.317	\$0	\$774.299.317
FUENTE: RB DIVIDENDOS ACUACAR 95	\$0	\$5.218.171.422	\$466.022.904	\$4.752.148.518
FUENTE: R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO 93	\$0	\$342.288.365	\$342.288.365	\$0
FUENTE: R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO 95	\$0	\$63.135.418	\$63.135.418	\$0
FUENTE: RB IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	\$0	\$21.411.060	\$0	\$21.411.060
FUENTE: SGP PROPOSITO GENERAL	\$0	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000
TOTALES	\$ 11.816.301.750	\$ 20.634.306.907	\$ 13.428.460.755	\$ 7.205.846.152

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %	
		31 DIC 2020	30-Sep-21		
<p>Se ha superado la meta del cuatrienio con la intervención de 35,1 kilómetros/carril, en su mayoría repavimentación y algunas adecuaciones.</p> <p>La meta de los estudios y diseños de ingeniería, también ha sido superada, entre estos se encuentran algunos de los proyectos de regalías.</p> <p>Las obras contingentes diferentes a vías también completada con énfasis en la limpieza de canales.</p>	KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS	CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES	20,39 km/carril	14,71km/carril	100%
	NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL	ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES	4	5	100%
	NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS	REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS	1	7	100%

Fuente: Secretaría de Infraestructura– Predis

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2022

LINEA ESTRATÉGICA: LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO URBANO					
PROGRAMA: SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HÁBITAT					
PROYECTO: REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$1.194.545.004	\$1.263.392.236	\$1.006.295.369	\$257.096.867	
FUENTE: DIVIDENDOS DE SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.267.081.637	\$2.067.081.637	\$1.288.806.839	\$778.274.798	
FUENTE: RB OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA	\$0	\$1.085.753.639	\$1.085.753.639	\$0	
TOTALES	\$ 2.461.626.641	\$4.416.227.512	\$3.380.855.847	\$1.035.371.665	
AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO					
DESCRIPCION DEL AVANCE	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023		AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
			31 DIC 2021	30-Sep-22	
<p>La meta de retiro de residuos solidos , el en cuatrienio es de difícil cumplimiento en consideración a que esta meta fue sobre valorada.</p> <p>La meta de rectificación de canales ha sido superada con la puesta en marcha del programa permanente de li empieza manual y mecánica de canales.</p>	METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE	RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES	36815,91	79529	32%
	KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y/O RECTIFICADOS	CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES	6,25	0,1	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA DE INDIAS

PROYECTO: REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$1.000.000.000	\$1.171.652.768	\$571.955.074	\$599.697.694
FUENTE: DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$1.000.000.000	\$600.000.000	\$932.158	\$599.067.842
FUENTE: RB DIVIDENDOS DE ACUACAR	\$ 0	\$567.844.209	\$0	\$567.844.209
FUENTE: OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA DE ALCANTARILLADO	\$0	\$106.911	\$0	\$106.911
FUENTE: OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA DE ALCANTARILLADO	\$0	\$797.435	\$0	\$797.435
FUENTE: RB CREDITO INTERNO	\$0	\$14,999,983,683	\$14,999,983,683	\$0
FUENTE: OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	\$0	\$644.031.299	\$0	\$644.031.299
TOTALES	\$ 2.000.000.000	\$ 17.984.416.305	\$ 15.572.870.915	\$ 2.411.545.390

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %	
		31 DIC 2021	30-Sep-22		
Las metas de este programa son compartida con planeación, EPA y EDURBE. Esta Secretaria realiza actividades relacionadas con el traslado del mercado de Bazurto (estudios) e intervención de los puentes sobre los cuerpos de agua.	AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA	EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO EN INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO)	11%	0%	55%

Fuente: Secretaría de Infraestructura- Predis

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

LINEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.					
PROGRAMA: ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.					
PROYECTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$400.000.000	\$159.500.000	\$152.505.000	\$ 6.995.000	
FUENTE: DIVIDENDOS DE SOCIEDAD PORTUARIA	\$400.000.000	\$0	\$0	\$0	
TOTALES	\$ 800.000.000	\$ 159.500.000	\$152.505.000	\$ 6.995.000	
DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %	
31 DIC 2021		30-Sep-22			
<p>Las metas de este programa son compartidas con Planeación, Valorización y el DAVD. Los estudios se están realizando en coordinación con la Secretaría de Planeación. La meta de rehabilitación de canales del cuatrienio se encuentra cumplida y superada. La meta de construcción de canales bajo calle, compartida con el DAVD aun sin iniciar, esta sujeta al recibo de los diseños por parte de este departamento.</p>	ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO	ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO	2,4	0	16,90%
	KILOMETROS DE CANALES SECUNDARIOS REHABILITADOS	REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS	100%	100%	100%
	KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE CONSTRUIDOS	CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE	0	0	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

LINEA ESTRATÉGICA: PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDÍGENA.

PROGRAMA: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

PROYECTO: ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO

PRESUPUESTO EJECUTADO

SALDO SIN EJECUTAR

FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

\$150.000.000

\$150.000.000

\$126.257.831

\$23.742.169

\$150.000.000

\$150.000.000

\$126.257.831


\$23.742.169

TOTALES

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %	
		31 DIC 2021	30-Sep-22		
Se han adecuado 10 centros de salud. Se tiene contemplado cumplir esta meta con los recursos asignados a esta Secretaria y al DADIS.	ADECUACION DE CENTROS DE SALUD COMUNIDAD ETNICA	ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRITORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS	4	6	55%

ACCIONES CIERRE 2022

1. Se esta adelantando la contratación de Fase III de la intervención de la malla vial.
2. Se continuara, hasta fin de año, con la ejecución de la limpieza manual y mecánica de los canales de la ciudad, contratos actualmente en ejecución.
3. Se continuara con la reposición de tapas y rejillas en la ciudad.
4. Se terminara la adecuación de edificio Galera de la Marina.
5. Con relación a los hospitales se espera terminar en un 100% el CAP de Barú y alcanzar, en un 90% la ejecución de los hospitales Pozón y Canapote.
6. Con el alistamiento de las actividades necesarias para iniciar la intervención del caño Juan Angola, se estima se iniciara el dragado el próximos mes.

An aerial photograph of a city, featuring a large, ornate cathedral with a prominent dome and spire in the center. The surrounding area includes modern buildings, streets, and greenery. The image is overlaid with a semi-transparent white horizontal band containing the title text.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
VIGENCIA 2023
Secretaría de Infraestructura**

PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Gastos de Funcionamiento	\$ 1.019.900.000
Gastos de Inversión	\$ 60.066.695.333
TOTAL	\$ 61.086.595.333

PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL 2023	VARIACION BRUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
Gastos de Funcionamiento	\$ 631.441.615	\$ 1.019.900.000	\$ 388.458.385	62%
Gastos de Inversión	\$17.227.928.391	\$60.066.695.333	\$ 42.838.766.942	249%
TOTAL	\$ 17.859.370.006	\$61.086.595.333	\$ 43.227.225.327	242%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2023

2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.019.900.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	\$ 1.006.000.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distrubucion de electricidad, gas y agua	\$ 6.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$ 1.000.000.000
2.1.2.02.02.008.01.06	Remuneracion de Servcios Tecnicos - Honorarios	\$ 1.000.000.000
2.1.2.02	Adquisicion diferentes de activos	\$ 4.000.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 4.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	\$ 4.000.000
2.1.2.02.01.003.01.06	Papeleria-Toner-utiles de oficina	\$ 4.000.000
	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 9.900.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 9.900.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 9.900.000
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas de oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 9.900.000

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2023

FUENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACION
1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$ 33.249.613.696,00	55%
1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ 2.817.081.637,00	5%
1.3.2.1.22-183 - TASAS AEROPORTUARIAS	\$ 24.000.000.000,00	40%
TOTAL	\$ 60.066.695.333,00	100%

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2023

PROGRAMAS	PROYECTO DE PRESUPUESTO
CARTAGENA SE MUEVE	\$ 47.891.695.333,00
SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HÁBITAT	\$ 5.000.000.000,00
INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 6.000.000.000,00
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.	\$ 1.000.000.000,00
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.	\$ 175.000.000,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2023

PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

PROGRAMA: CARTAGENA SE MUEVE

RUBRO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+	PRESUPUESTADO
	\$47.891.695.333,00
FUENTE: Ingresos corrientes de libre destinación	\$23.891.695.333,00
FUENTE: Tasas Aeroportuarias	\$24.000.000.000,00

METAS PLAN DE DESARROLLO

1. CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJORAR 32 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES
2. ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES
3. REALIZAR HASTA 8 LAS OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

PROGRAMA: SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HÁBITAT

RUBRO: SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT ET+	PRESUPUESTADO
	\$ 5.000.000.000,00
FUENTE: Ingresos corrientes de libre destinación	\$3.732.918.363,00
FUENTE:: Dividendos Sociedad Portuaria	\$1.267.081.637,00

METAS PLAN DE DESARROLLO

- 1.RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES
- 2.CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2023

PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA DE INDIAS

RUBRO: RECUPERACION INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+	PRESUPUESTADO
	\$ 6.000.000.000,00
FUENTE: Ingresos corrientes de libre destinación	\$5.000.000.000,00
FUENTE: Dividendos Sociedad Portuaria	\$ 1.000.000.000,00

METAS PLAN DE DESARROLLO

1.EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO EN INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO)

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2023

PILAR ESTRATÉGICO: CARTAGENA RESILIENTE

PROGRAMA: ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.

RUBRO: ORDENAMIENTO Y RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN.	PRESUPUESTADO
	\$ 1.000.000.000,00
FUENTE: Ingresos corrientes de libre destinación	\$500.000.000,00
FUENTE: Dividendos Sociedad Portuaria	\$500.000.000,00

METAS PLAN DE DESARROLLO

1. Estudios y diseños ajustados para la construcción 14.2 km del tramo este de la Vía Perimetral con calles de servicio y absceso
2. Rehabilitar 3.5 kilometro canales secundarios.
3. Construir 7 kilometro de canales bajo calle.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2023

EJE TRASVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL

PROGRAMA: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

RUBRO: ADECUACION DE CENTRO DE SALUD PARA LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN DISTRITO DE CARTAGENA	PRESUPUESTADO
	\$ 175.000.000,00
FUENTE: Ingresos corrientes de libre destinación	\$ 125.000.000,00
FUENTE: Dividendos Sociedad Portuaria	\$50.000.000,00

METAS PLAN DE DESARROLLO

1. Adecuación de 26 centros de salud en territorio de consejos comunitarios.

An aerial, high-angle photograph of a city, likely in a tropical region, featuring a prominent cathedral with a large dome and a tall spire. The cathedral is surrounded by other buildings, including one with a corrugated metal roof. The background is filled with lush greenery and palm trees. The entire image is overlaid with a semi-transparent grey filter.

GRACIAS
